STELITANO APPALTI SRL

CRONOPROGRAMME PER:

PROGETTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA DI COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I COMUNI DI LOCATE TRIULZI, CARPIANO, MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO NELL' AMBITO DELL'INIZIATIVA POS FESR 2014-2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA

	inizio	GG
PROGETTO MOBILITA' CICLISTICA	1	245
TOTALE CANTIERE	**0**	**245**
REALIZZAZIONE CICLABILE CERRO AL LAMBRO	**17**	**70**
ALLESTIMENTO CANTIERE	17	2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	18	30
RIMOZIONI SOTTOSERVIZI DA ENTI PREPOSTI	38	10
BANCHETTONE E CORDOLO SU CAVO IRRIUGUO	26	15
REALIZZAZIONE NUOVO PACCHETTO TRATTO 2	29	25
ALLARGAMENTO PISTA ESISTENTE TRATTO 1	28	52
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	54	15
SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE	72	15
OPERE DI FINITURA	81	15
RIMOZIONE CANTIERE	97	2
REALIZZAZIONE CICLABILE C MELEGNANO	70	117
ALLESTIMENTO CANTIERE	70	3
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	70	30
RIMOZIONI SOTTOSERVIZI DA ENTI PREPOSTI	100	14
REALIZZAZIONE NUOVO PACCHETTO	114	40
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	124	20
SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE	154	15
OPERE DI FINITURA	169	15
RIMOZIONE CANTIERE	184	3
REALIZZAZIONE CICLABILE CARPIANO	70	117
ALLESTIMENTO CANTIERE	70	3
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	70	30
BANCHETTONI	95	10
REALIZZAZIONE NUOVO PACCHETTO	95	50
SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE	145	15
OPERE DI FINITURA	155	15
RIMOZIONE CANTIERE	165	3
REALIZZAZIONE CICLABILE CLOCATE TRIULZI	117	128
ALLESTIMENTO CANTIERE	117	3
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	118	30
RIMOZIONI SOTTOSERVIZI DA ENTI PREPOSTI	120	15
REALIZZAZIONE NUOVO PACCHETTO	148	50
ATTRAVERSAMENTO A RASO SULLA BINASCHINA	198	20
SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE	218	15
OPERE DI FINITURA	227	15
RIMOZIONE CANTIERE	242	3

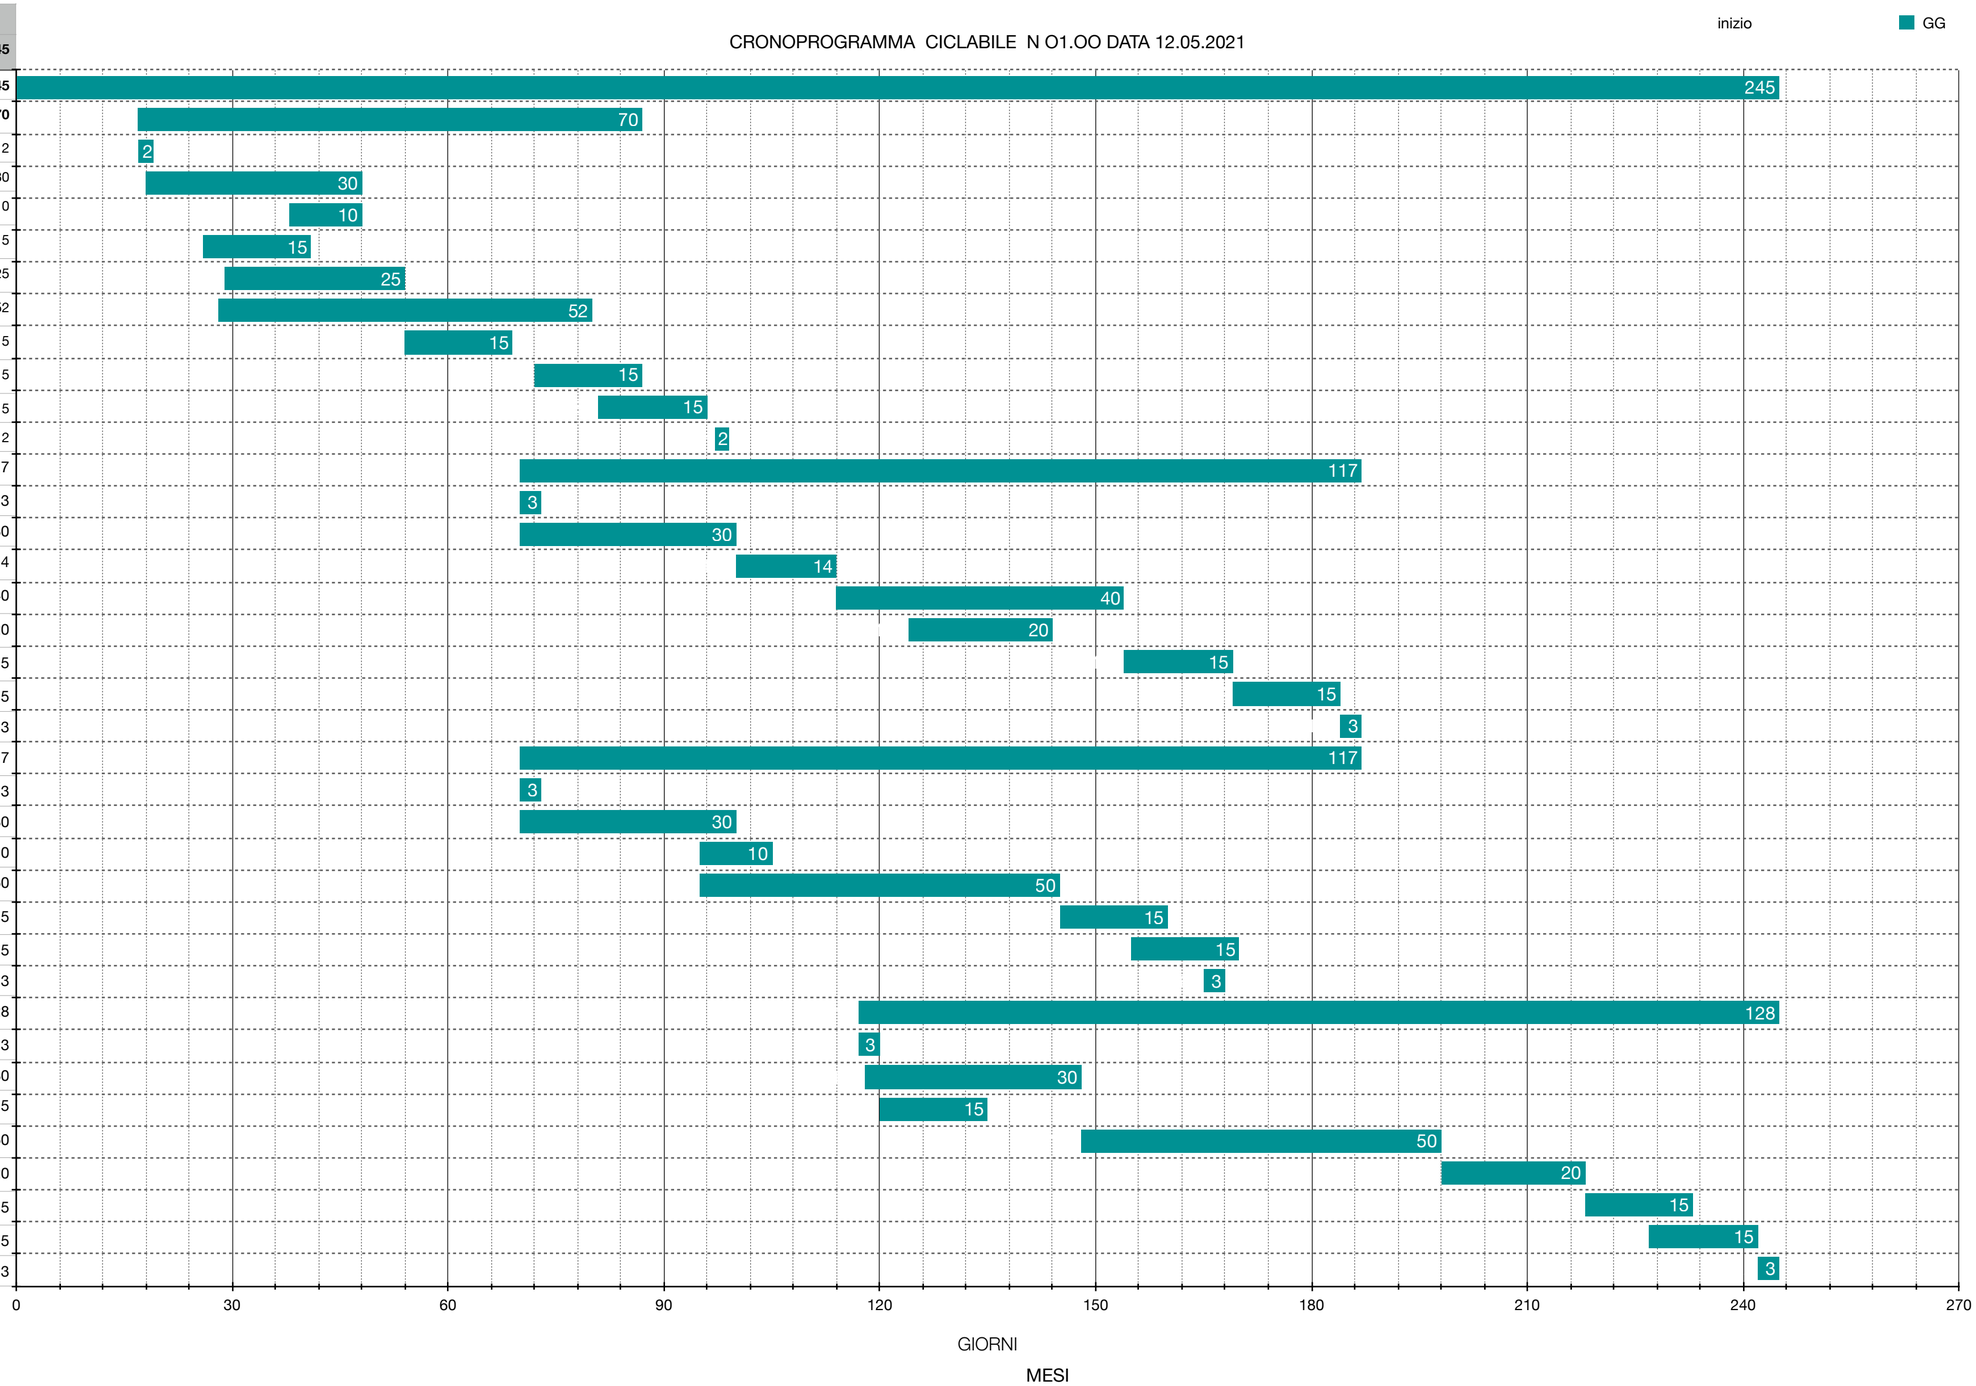

maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio
